

城东酥肉股份有限公司“首尔之春”韩餐店 两阶段建设项目管理汇报书

项目组

2026 年 7 月 8 日

摘要

本汇报书围绕“首尔之春”韩餐店建设项目展开，采用“两阶段投资、先验证后优化”的项目管理思路：项目全程以 200 万元为资金上限，前期建设小型韩餐店，验证选址、菜品、供应链、人员培训和校园客群转化；后期在运营指标达标后，继续围绕 200 万元预算进行门店优化、品牌露出和标准化运营能力建设。报告从项目范围、进度计划、关键路径、PERT 三点估算、挣值分析、资源重排、装修外包、风险控制和阶段门决策等方面进行说明，目标是在控制成本与工期的前提下完成门店开业，并为后续扩张提供可复用的管理模板。

目录

1	项目背景与总体思路	3
1.1	项目背景	3
1.2	两阶段建设目标	3
2	项目范围与交付成果	3
2.1	项目范围说明	3
2.2	不纳入本期范围的内容	4
2.3	主要交付成果	4
3	组织结构与责任分工	5
3.1	项目组织	5
3.2	RACI 责任矩阵	5
4	进度计划与关键路径	6
4.1	基准工期	6
4.2	关键路径	6
4.3	关键活动控制要点	6

目录	2
5 PERT 三点估算与工期不确定性	8
5.1 估算方法	8
5.2 估算结果	8
6 投资预算与成本管理	9
6.1 前期小型店 200 万元预算	9
6.2 后期门店 200 万元预算	10
6.3 成本控制机制	10
6.4 200 万元口径财务测算	10
7 EVM 挣值分析	11
7.1 分析假设	11
7.2 项目 200 万元情景	12
7.3 EVM 管理结论	12
8 资源受限与进度重排	12
8.1 资源冲突识别	12
8.2 资源重排方案	12
9 装修外包与约束优化	14
9.1 外包决策	14
9.2 B3 装修施工二级 WBS	15
9.3 外包约束	15
10 风险管理	15
11 阶段门与后期扩张条件	16
11.1 第一阶段完成标准	16
11.2 进入第二阶段的决策门	16
12 结论	17

1 项目背景与总体思路

1.1 项目背景

随着大学城周边餐饮消费持续增长，韩式烤肉、韩式拌饭、部队锅、炸鸡年糕等产品兼具社交属性和高频消费潜力，适合面向学生、教职工和周边居民开展中档餐饮服务。本项目拟以“首尔之春”为门店品牌，依托城东酥肉股份有限公司现有组织与资金基础，完成韩餐店从策划、选址、证照、装修、设备、供应链、招聘培训到试营业和正式开业的全过程管理。

项目采用“两阶段”路线：第一阶段投入 200 万元建设小型韩餐店，降低一次性投入风险，集中验证产品、客流和运营流程；第二阶段在第一阶段经营数据达标后，继续以 200 万元预算为上限，优化门店配置、品牌曝光和供应链议价能力。

1.2 两阶段建设目标

表 1: 两阶段项目目标对比

项目维度	前期：小型韩餐店	后期：优化型韩餐店
投资规模	200 万元	200 万元
战略定位	低风险试点店，验证商业模式	优化提升店，强化品牌与运营能力
目标客群	大学生、教职工、周边居民	校园客群、周边居民、家庭聚餐和小型团餐客流
管理重点	控制预算、快速开业、形成标准作业流程	优化产能、提升品牌、完善供应链和人才梯队
核心交付物	小型门店开业、基础菜单、供应商合同、培训记录、试营业复盘	优化后门店开业、品牌视觉、采购清单、管理制度、营销体系
成功标准	门店稳定运营，核心菜品毛利达标，试营业反馈良好	客流和翻台率稳定，品牌知名度提升，具备复制条件

2 项目范围与交付成果

2.1 项目范围说明

本项目范围包括韩餐店开业前后必要的全部项目活动，主要覆盖以下五类工作包：

- 启动与策划：立项分工、市场调研、商业计划、预算测算、选址谈判与租赁签约。

- 2. 证照与装修：装修设计、营业执照、食品经营许可、装修施工、墙面粉刷外包、消防与卫生验收。
- 3. 菜品与供应链：菜单研发、价格测算、设备采购、设备安装调试、食材供应商签约与开业备货。
- 4. 招聘与培训：店长、厨师、前厅、后厨和兼职人员招聘，服务流程培训、岗前试菜、排班和应急预案。
- 5. 推广与开业：校园社群预热、试营业、正式开业活动、首月经营数据复盘。

2.2 不纳入本期范围的内容

第一阶段小型店不建设中央厨房，不进行跨城市连锁扩张，不采购明显超出门店产能的重资产设备。第二阶段大型店是否建设中央厨房、会员系统和跨店配送能力，应在第一阶段运营数据达标后另行立项。

2.3 主要交付成果

表 2: 项目主要交付成果

交付类别	具体成果
管理类成果	项目章程、WBS、进度计划、责任矩阵、风险清单、阶段复盘报告
经营类成果	商业计划书、菜单与定价表、供应商合同、采购清单、库存标准
建设类成果	租赁合同、装修设计图、施工验收记录、设备安装调试记录
人员类成果	招聘结果、培训记录、岗位说明书、排班表、服务标准流程
开业类成果	试营业记录、客户反馈、营销物料、正式开业方案、首月复盘报告

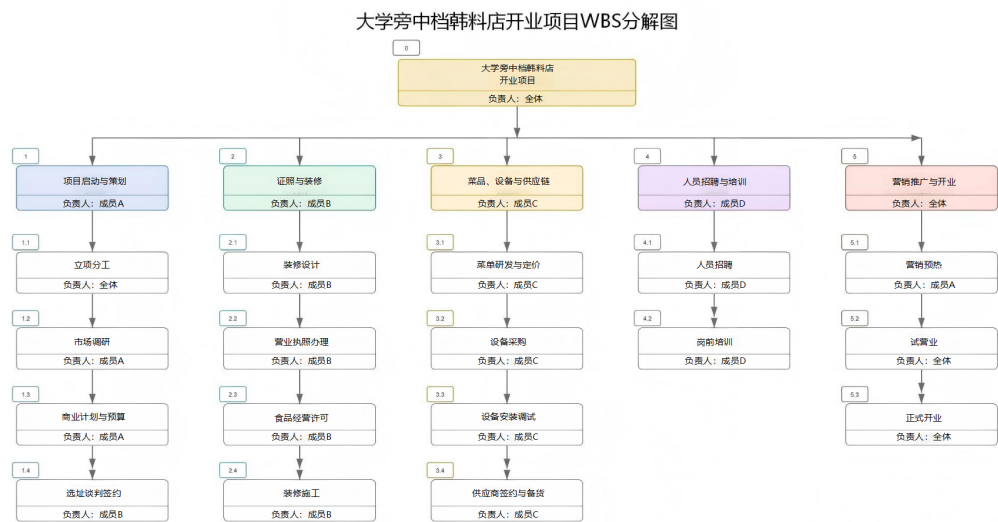


图 1: 项目 WBS 分解图

3 组织结构与责任分工

3.1 项目组织

项目组设项目负责人 1 名，统筹范围、进度、预算与风险；成员 A 负责商业计划、预算和选址谈判；成员 B 负责装修设计、证照跟进和装修验收；成员 C 负责设备采购、安装调试、供应商签约和备货；成员 D 负责招聘培训、营销预热、试营业和客户反馈。

3.2 RACI 责任矩阵

表 3: 核心工作 RACI 责任矩阵

工作内容	A	B	C	D	说明
商业计划与预算	A/R	C	C	I	A 负责测算投资回报和预算边界
选址谈判签约	A/R	C	I	I	与租金、客流和开业窗口直接相关
装修设计确认	C	A/R	C	I	B 对方案和施工接口最终负责
墙面粉刷外包	I	A	C	I	外包队为 R，B 负责验收闭环
设备采购与安装	I	C	A/R	I	C 负责设备供应商与现场调试
招聘与培训	I	I	C	A/R	D 负责岗位到位和服务流程培训
试营业与开业活动	C	I	C	A/R	D 组织试营业反馈和开业营销

注：A 表示最终负责，R 表示执行，C 表示协作或咨询，I 表示知会。

责任矩阵图 (RACI)				
A=最终负责, R=执行, C=协作/咨询, I=知会				
任务	成员A 项目统筹/营销	成员B 选址装修/证照	成员C 菜品设备/供应链	成员D 招聘/培训
A1 立项分工	A/R	C	C	C
A2 市场调研	A/R	C	C	C
A3 商业计划与预算	A/R	C	C	I
A4 选址谈判签约	C	A/R	C	I
B1-B3 装修设计与施工	I	A/R	C	I
B2 证照办理	I	A/R	C	I
C1-C3 菜品/设备	C	I	A/R	C
E1-E2 供应商/备货	I	C	A/R	C
D1-D2 招聘与培训	C	I	C	A/R
F1 营销预热	A/R	C	C	C
F2-G 试营业与开业	A/R	A/R	A/R	A/R

图 2: 项目责任矩阵图

4 进度计划与关键路径

4.1 基准工期

根据现有 MPP 计划，项目基准总工期为 112 天。项目从立项分工开始，经过市场调研、商业计划、选址签约、装修设计、装修施工、设备安装、供应商签约、试营业和正式开业，最终完成门店开业交付。

4.2 关键路径

项目关键路径为：

A1 立项分工 → A2 市场调研 → A3 商业计划与预算 → A4 选址谈判签约 → B1 装修设计 → B3 装修施工 → C3 设备安装调试 → E1/E2 供应商签约与备货 → F2 试营业 → H 开业前缓冲 → G 正式开业阶段

其中，B3 装修施工工期为 20 天，是连接选址、设计、设备和试营业的关键环节；H 开业前缓冲为 5 天，用于试营业反馈、现场收口、物料确认和突发问题处理，不宜随意取消。

4.3 关键活动控制要点

表 4: 关键活动控制要点

编号	活动	管理重点
----	----	------

A4	选址谈判签约	控制租金水平、免租期、物业条件、排烟和消防可行性，避免后期返工。
B1	装修设计	在第 35 至 45 天完成方案确认，保障第 45 天装修施工进场。
B3	装修施工	严控水电、排烟、消防、墙面粉刷、通风保护和收口验收。
C3	设备安装调试	设备进场前确认电力、排水、排烟和操作动线。
E1/E2	供应签约与备货	先锁定供应框架、报价和账期，再组织开业备货。
F2	试营业	检验出餐效率、服务流程、菜品稳定性和顾客反馈。
G	正式开业	控制开业活动强度，避免营销承诺超过门店承载能力。

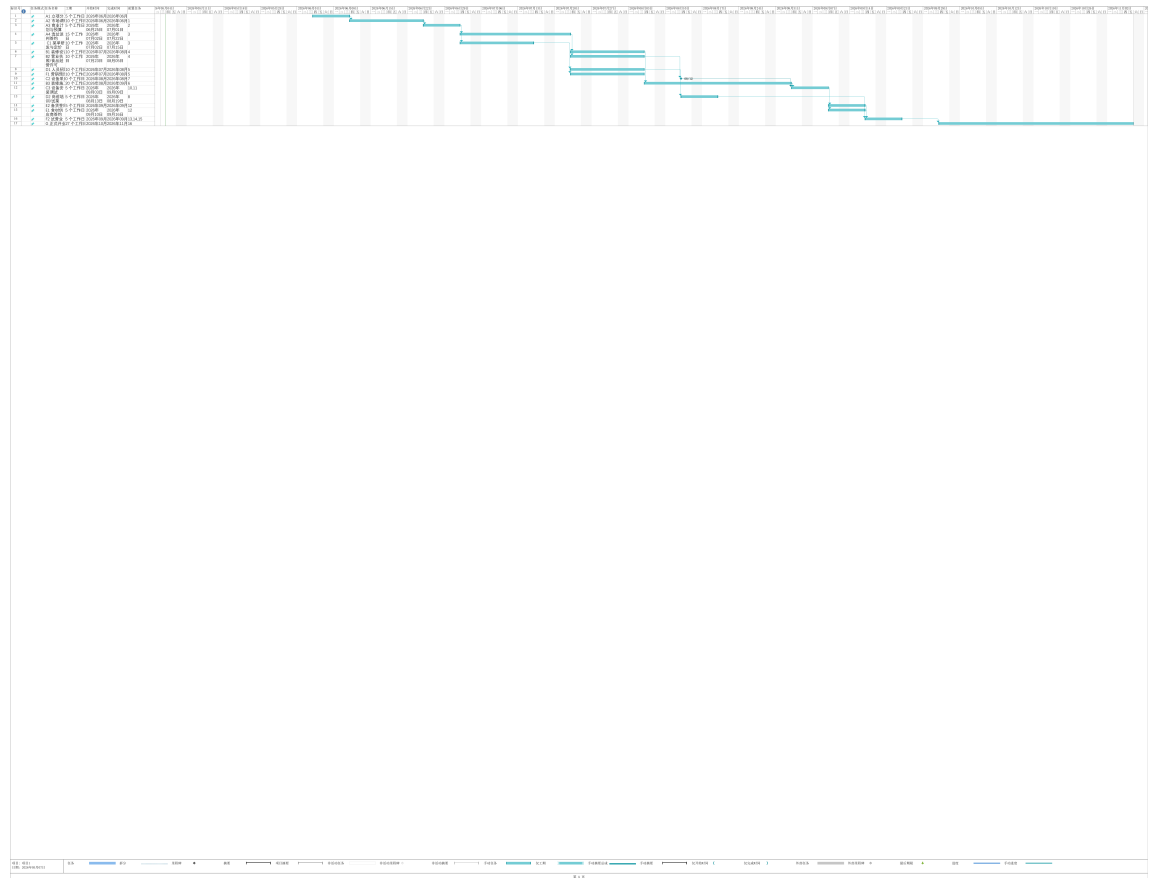


图 3: 项目甘特图预览



图 4: 项目网络图预览

5 PERT 三点估算与工期不确定性

5.1 估算方法

为考虑选址、装修、证照和开业活动的不确定性，项目采用 PERT 三点估算方法。单项活动期望时间计算公式为：

$$T_e = \frac{a + 4m + b}{6}$$

其中， a 为最乐观工期， m 为最可能工期， b 为最悲观工期。活动方差为：

$$\sigma^2 = \left(\frac{b - a}{6} \right)^2$$

5.2 估算结果

在关键路径活动上进行 PERT 估算后，项目期望工期为 115.33 天，约为 115.3 天；项目方差为 32.0，标准差为 5.66 天。与 MPP 确定性计划 112 天相比，考虑风险后的期望工期增加约 3.3 天。

表 5: 项目完成概率区间

置信区间	工期范围	管理含义
68%	109.7 至 121.0 天	常规课堂汇报和内部进度沟通可采用
95%	104.0 至 126.6 天	对外承诺开业日期时应重点参考
99%	98.4 至 132.3 天	用于极端风险下的压力测试

估算结果说明，项目表面上可以按 112 天推进，但实际管理中应以 115 天左右作为更稳妥的期望工期，并对选址谈判、装修施工和正式开业活动设置重点监控。

6 投资预算与成本管理

6.1 前期小型店 200 万元预算

第一阶段预算以“能开业、能运营、能验证”为原则，避免过度装修和重资产投入。

表 6: 小型韩餐店 200 万元预算分配

费用项	金额（万元）	用途说明
租金、押金及转让相关费用	35	覆盖门店租赁启动成本和必要押金
装修与基础施工	55	水电、排烟、墙面、地面、消防和基础装饰
厨房与前厅设备	45	烤炉、冷柜、排烟设备、收银系统和餐具
首批食材与供应链启动	15	试营业和开业初期备货
证照、设计与咨询	8	营业执照、食品经营许可、设计咨询等
招聘、培训与开办人工	18	核心岗位招聘、培训和试营业人工
开业营销	12	校园社群、团购平台、开业物料和优惠活动
预备费	12	应对装修变更、设备补采和证照延迟
合计	200	

6.2 后期门店 200 万元预算

第二阶段预算仍以 200 万元为资金上限，在第一阶段数据达标后启动，重点放在门店优化、品牌露出和标准化能力建设，而不是一次性扩大投资规模。

表 7: 后期韩餐店 200 万元预算分配

费用项	金额（万元）	用途说明
场地租赁、押金及商圈进入成本	36	覆盖门店租赁、押金和必要位置优化成本
设计装修与工程施工	60	控制装修标准，优先保障排烟消防、墙面地面和工程验收
厨房设备与前厅设备	36	补充烤肉、冷柜、洗消、排烟、叫号和收银相关设备
品牌视觉、IT 系统与会员工具	10	门头、菜单、会员工具、数据记录和线上运营工具
供应链建设与首批库存	16	核心食材协议、开业备货和安全库存
人员招聘与培训	16	店长、厨师、前厅服务和兼职人员的招聘培训
开业营销与品牌推广	14	校园推广、团购平台、探店内容和会员拉新
预备费	12	应对工程变更、设备涨价、审批延迟和营销调整
合计	200	

6.3 成本控制机制

项目成本控制采用“预算基线 + 变更审批 + 挣值分析”的方式。装修、设备和营销是最容易超支的三类费用，应设置审批阈值：单项变更超过预算 10% 或金额超过 5 万元时，必须由项目负责人复核；涉及关键路径的变更还需同步评估对工期的影响。

6.4 200 万元口径财务测算

由于本项目资金上限为 200 万元，财务测算应采用小型门店口径，不能沿用大型店的座位数、客单价和活动规模。按 60 座、1.8 次翻台、68 元客单价、330 个营业日估算，第一年堂食收入约 242.4 万元；外卖按 60 单/天、45 元/单、330 天估算，约 89.1 万元；饮品和小食加购约 10.7 万元，团购及校园活动约 38.4 万元。因此，第一年营业收入合计

约 380.6 万元。

成本端同步按小型店规模测算。第一年食材成本按收入的 38% 估算，人工约 78 万元，租金约 42 万元，水电能耗约 18 万元，营销费用按收入的 7.5% 估算，管理及杂费约 18 万元，税费按收入的 5% 估算。由此得到第一年总成本约 348.2 万元，经营现金流约 32.4 万元。

表 8: 200 万元口径下的财务测算结果

指标	测算结果
初始投资	200.0 万元
第一年营业收入	380.6 万元
第一年总成本	348.2 万元
第一年经营现金流	32.4 万元
NPV（贴现率 5%）	26.7 万元
静态回本期	约 4.60 年
贴现后 BEP	第 6 年

测算结果说明，小型店在 200 万元投资约束下仍具备正 NPV，但回本并非第一年完成，而是需要依靠后续经营增长逐步覆盖初始投入。因此，项目管理重点应放在控制装修和设备超支、稳定食材成本率、提高翻台率和复购率，而不是用大型店收入假设放大投资回报。

7 EVM 挣值分析

7.1 分析假设

项目运行到三分之一节点时，计划完成比例为 33.3%，实际进度提前 20%，当前成本超支 20%。据此计算计划价值 PV、挣值 EV、实际成本 AC、成本偏差 CV、进度偏差 SV、成本绩效指数 CPI 和进度绩效指数 SPI。

7.2 项目 200 万元情景

表 9: 200 万元 BAC 情景下的 EVM 指标

指标	数值	含义
BAC	200.0 万元	完工预算
PV	66.6 万元	按计划应完成的价值
EV	79.9 万元	实际已完成工作的预算价值
AC	95.9 万元	实际发生成本
CV	-16.0 万元	成本超支
SV	13.3 万元	进度提前
CPI	0.833	成本效率偏低
SPI	1.200	进度效率高于计划

7.3 EVM 管理结论

EVM 结论为：项目进度提前，但成本效率偏低。管理上不应只强调“进度快”，还应关注提前采购、赶工、装修加项和营销预支是否造成预算失控。建议把进度优势转化为风险缓冲，同时冻结非必要变更，优先复核装修、设备和营销支出。

8 资源受限与进度重排

8.1 资源冲突识别

根据计划安排，资源冲突主要出现在两个区间：

- B 侧冲突：第 35 至 45 天，B1 装修设计与 B2 营业执照、食品经营许可并行，均需要成员 B 处理设计确认、证照材料和审批沟通。
- C 侧冲突：第 70 至 75 天，E1 食材供应商签约与 E2 开业备货并行，均占用成员 C。

8.2 资源重排方案


资源重排遵循“优先保障关键路径，不轻易拉长总工期”的原则。B 侧保持 B1 第 35 至 45 天完成，确保 B3 第 45 天进场；B2 利用浮时顺延至第 45 至 55 天。C 侧保持 E1 第 70 至 75 天完成，E2 顺延至第 75 至 80 天，F2 试营业顺延至第 80 至 85 天，占用原本的 5 天开业前缓冲，正式开业仍从第 85 天开始，总工期仍为 112 天。

表 10: 资源重排前后对比

活动	原计划	重排后	说明
B1 装修设计	第 35 至 45 天	第 35 至 45 天	保持不变，保障装修施工进场
B2 证照许可	第 35 至 45 天	第 45 至 55 天	利用浮时解决 B 侧冲突
E1 供应商签约	第 70 至 75 天	第 70 至 75 天	先锁定供应框架和报价
E2 开业备货	第 70 至 75 天	第 75 至 80 天	顺接供应商签约结果
F2 试营业	第 75 至 80 天	第 80 至 85 天	占用开业前缓冲
G 正式开业	第 85 至 112 天	第 85 至 112 天	正式开业节点不变

过度分配的资源

工作状态
过度分配的资源的工作状态。

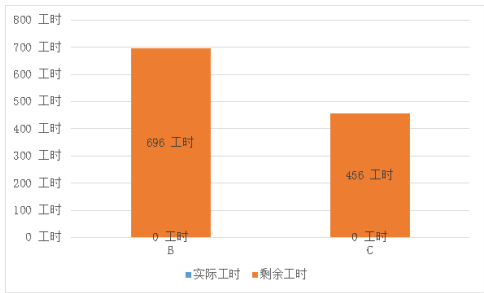

过度分配
分配给过度分配的资源的剩余工时。要解决资源过度分配，请使用
工作组规划器视图

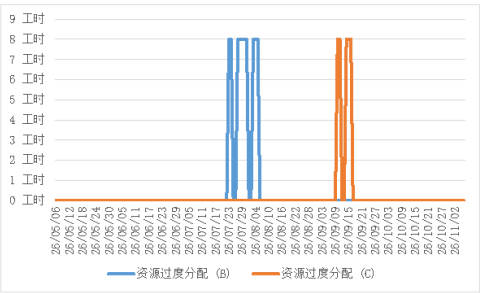


图 5: 资源过度分配图

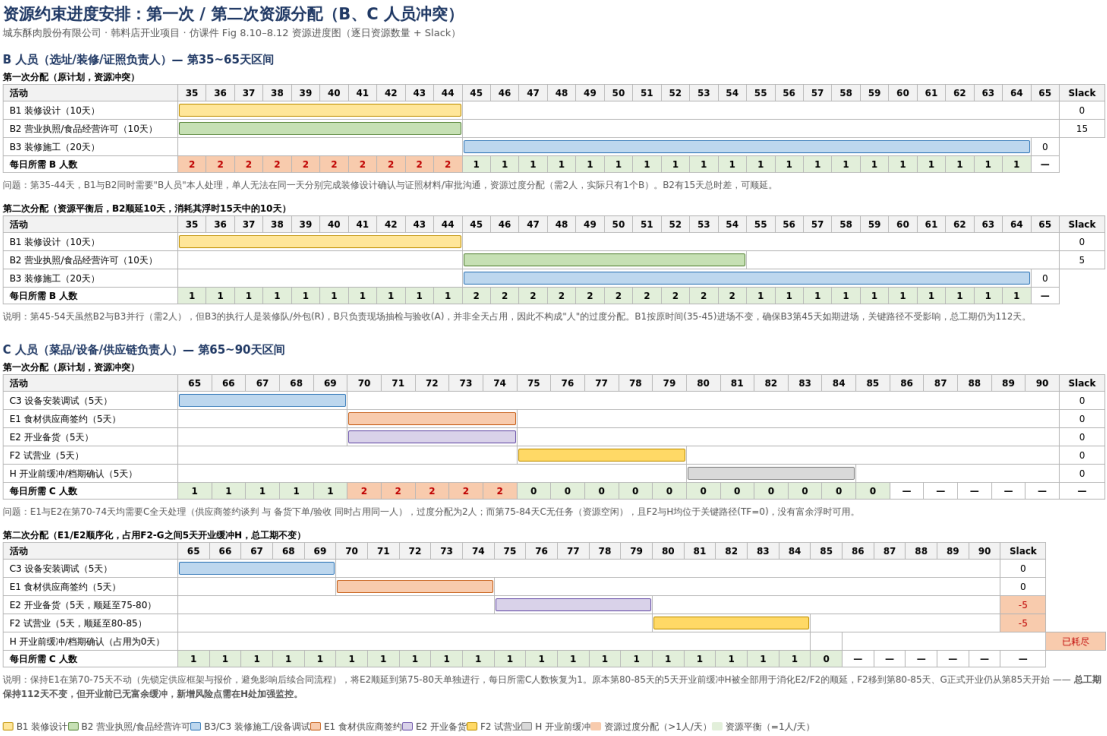


图 6: 资源约束后的进度安排

9 装修外包与约束优化

9.1 外包决策

墙面粉刷作为 B3 装修施工中的专业子项，不由 A、B、C、D 成员直接执行，而是外包给专业施工队。外包队负责具体施工，成员 B 负责开工确认、过程抽检、完工验收和整改关闭。

该安排的理由包括：第一，成员 B 已经参与选址、装修设计、证照和验收，若继续承担粉刷执行，容易形成单点过载；第二，专业粉刷队在基层处理、环保材料、色差控制和工期压缩方面更有经验；第三，将“施工执行”和“验收责任”分开，更利于质量控制。

9.2 B3 装修施工二级 WBS

表 11: B3 装修施工二级 WBS

编号	子任务	时间安排	交付要求
B3.1	基础施工	第 45 至 51 天	水电、排烟、消防预留和关键管线完成
B3.2	墙面基层	第 52 至 54 天	找平、修补、打磨，达到粉刷条件
B3.3	墙面粉刷	第 55 至 59 天	外包队执行，B 控制质量、进度和材料
B3.4	通风保护	第 60 至 61 天	保证干燥、通风、环保和设备进场条件
B3.5	收口验收	第 62 至 65 天	完成整改清单、验收记录并移交设备安装

9.3 外包约束

外包开始时间不是签合同当天，而是设计、预算、材料和现场条件均确认后，具备进场施工条件的日期。外包结束时间也不是工人离场当天，而是施工完成、整改关闭、B 验收通过并能移交下一道工序的日期。

为降低返工风险，项目设置三个验收关口：开工前确认墙面颜色、环保材料、报价上限、质保期和完工日期；施工中由 B 每天或隔天抽检基层平整度、色差、污染保护和现场安全；完工后若验收不通过，由外包队返工，返工费用和延期责任按合同执行。

10 风险管理

表 12: 项目主要风险与应对措施

风险事项	影响	概率	影响程度	应对措施
选址谈判延迟	推迟装修设计和施工进场	中	高	准备备选铺位,提前核查排烟、消防和租金条件
证照办理滞后	影响试营业和正式营业合规性	中	高	提前准备材料,专人跟进审批节点,必要时咨询专业机构

装修施工返工	增加工期和成本	中	高	明确验收标准,设置过程抽检和 10% 变更审批阈值
设备到货延期	影响安装调试和试营业	中	中	关键设备提前下单,准备替代供应商和临时设备方案
人员招聘不足	影响服务质量和翻台效率	中	中	提前招聘店长和厨师长, 建立兼职储备池
开业客流不及预期	影响收入和品牌声量	中	高	分阶段预热,试营业收集反馈,优化团购与校园社群投放
成本超支	挤压现金流和营销预算	中	高	按 EVM 监控 CPI, 冻结非必要采购,重大变更复核
食材价格波动	影响毛利率	中	中	签订框架协议,设置安全库存和替代菜品方案

11 阶段门与后期扩张条件

11.1 第一阶段完成标准

前期 200 万元小型店不是简单“开出来”，而是要形成后期 200 万元优化投入的判断依据。第一阶段应在开业后 1 至 3 个月完成复盘，重点观察以下指标：

- 日均客流、翻台率和高峰期排队情况达到预期；
- 核心菜品毛利率稳定，损耗率可控；
- 顾客评价集中问题可被菜单、服务或流程调整解决；
- 供应商供货稳定，账期、价格和配送质量可控；
- 人员排班、培训、出餐和收银流程可复制；
- 现金流未出现持续性紧张，装修和设备投入未明显透支。

11.2 进入第二阶段的决策门

只有当小型店达到阶段门标准后，才建议启动后期 200 万元门店优化建设。阶段门决策如下：

表 13: 第二阶段启动决策门

决策项	通过标准	决策含义
经营验证	连续经营数据稳定,核心菜品毛利达标	证明商业模式可行
客群验证	校园与周边客群复购明显,评价稳定	证明品牌有扩张基础
供应链验证	主供应商稳定,备选供应商可用	降低后期运营断供风险
人才验证	店长、厨师长和主管岗位可承担培训任务	具备复制组织能力
财务验证	现金流和成本偏差在可控区间	避免盲目扩大投资

若上述指标未达标，应优先优化第一阶段门店，而不是直接进入后期追加投入。后期 200 万元项目的本质不是“把店做大”，而是在资金约束内把已经验证的产品、流程和品牌能力做稳。

12 结论

本项目以项目管理方法重新组织韩餐店开业工作，将看似零散的选址、装修、证照、采购、招聘、培训和营销活动整合为可计划、可监控、可复盘的项目体系。前期 200 万元小型店承担商业模式验证任务，重点是控制预算、压缩试错成本、形成标准流程；后期 200 万元门店优化承担运营提升任务，重点是品牌建设、产能优化、供应链稳定和组织复制。

从进度角度看，MPP 基准工期为 112 天，PERT 期望工期为 115.3 天，说明项目应保留合理缓冲。从成本角度看，EVM 显示项目可能出现“进度提前但成本超支”的状态，需要严格控制装修、设备和营销费用。从资源角度看，通过 B 侧和 C 侧错峰安排，可以在不增加总工期的前提下消除资源冲突。从外包角度看，墙面粉刷交由专业队伍执行，项目组保留验收和接口控制，可以降低返工与人员过载风险。

因此，本项目建议按照“200 万元试点、数据复盘、阶段门评审、200 万元优化”的路径推进。这样既能保障前期开业落地，也能为后期韩餐店优化建设提供更可靠的决策依据。
